

BAUINFORMATIONEN

Januar 2021

HPA Railway Infrastructure
Donnerstag, 21.01.2021

01

Baumaßnahmen 2021 - Oberbau
Henrik Piegler

02

Projekt Verkehrsanbindung Burchardkai -
3. Gleis nach Mühlenwerder
Jens Dippel

03



Baustellen der DEGES in Verbindung mit
der Hafенbahn
Hans-Otto Cramer

04

Fragen und Antworten

01


Baumaßnahmen 2021 - Oberbau
Henrik Piegler

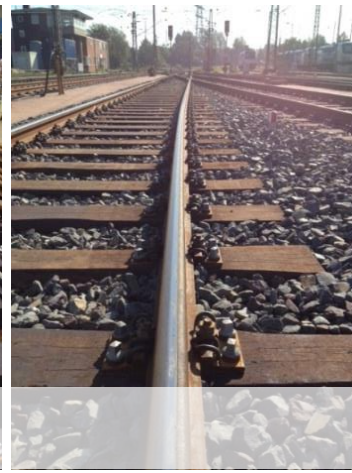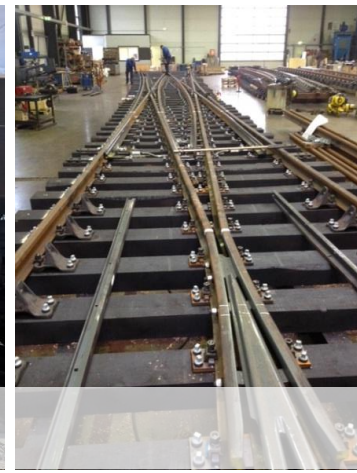

Baumaßnahmen 2021- Oberbau




Bahnübergänge Veddeler Damm

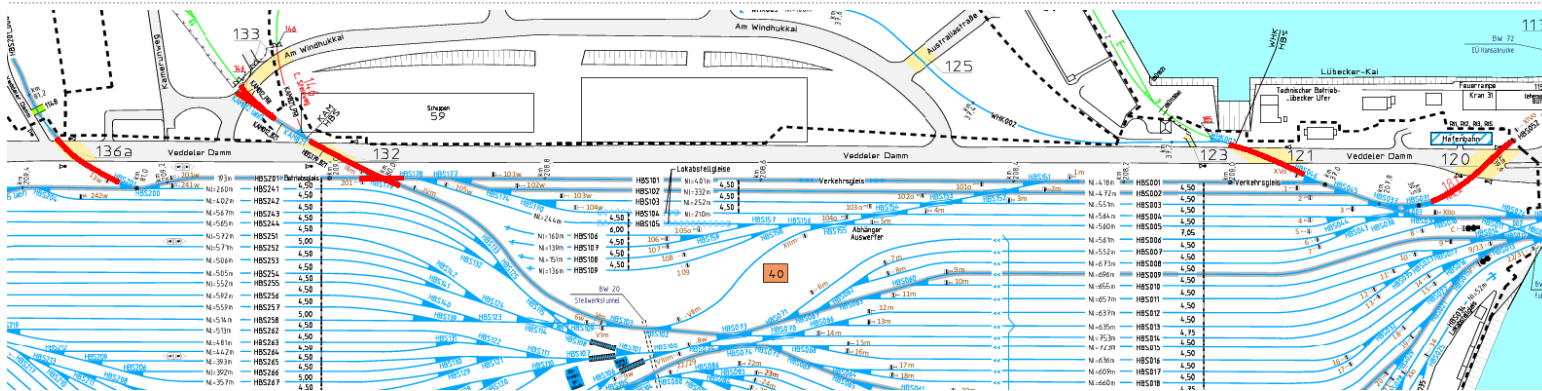


- BÜ 133, KAM 012W:
 - Fr, 30.07.21, 18:30 h bis Mo, 02.08.2021, 04:00 h (einschl. Vollsperrung Straße)
- BÜ 136a
 - Di, 03.08.21, 09:00 h bis Mo, 09.08.21, 05:00 h (Vollsperrung Straße: Fr. 06.08.21, 18:30 h – Mo. 09.08.21, 04:00 h)
- BÜ 120, 121 und Gleis HBS 052G
 - Mo, 09.08.21, 09:00 h - Mo, 16.08.21, 06:00 h (Vollsperrung Straße: Fr, 13.08.21, 18:30 h - Mo, 16.08.21, 04:00 h)
- BÜ 132, Weiche HBS 179W
 - Mo, 30.08.21, 09:00 h - Mo, 06.09.21, 05:00 h (Vollsperrung Straße: Fr, 03.09.21, 18:30 h - Mo, 06.09.21, 04:00 h)

Gleise und Weichen Hamburg Süd

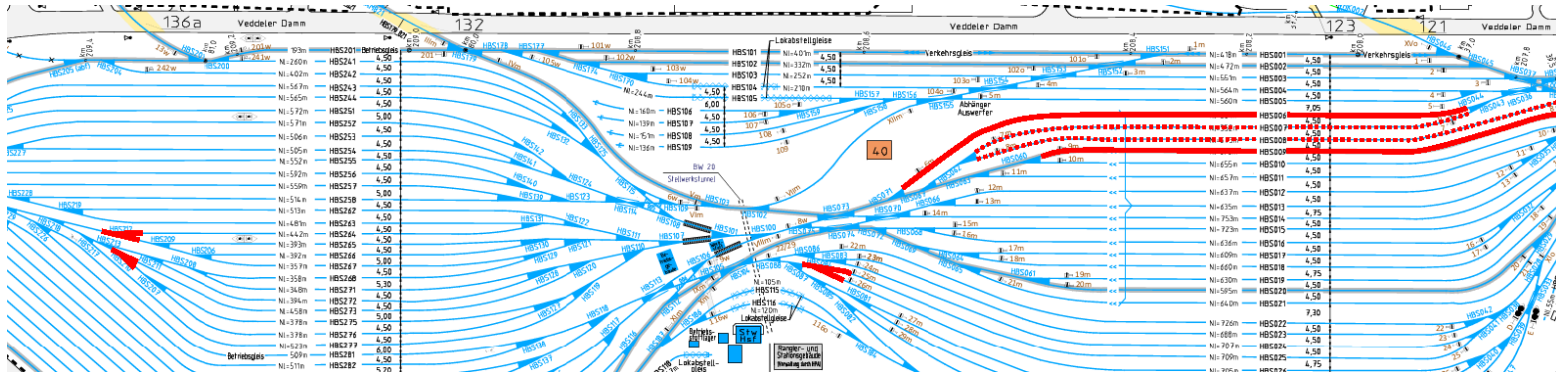

- Gleise HBS 006G, HBS 009G (Logistik: HBS 007G, HBS 008G)
 - Di, 07.09.21, 07:00 Uhr - Do, 14.10.21, 17:00 h
- Weichen HBS 210W, HBS 212W
 - Mi, 20.10.21, 7:00 Uhr bis Mo, 25.10.21, 09:00 h
- Weiche HBS 084W
 - Fr, 22.10.21, 07:00 Uhr bis Mo, 25.10.21, 09:00 h


Gleis- und Weichenerneuerung Roeloffsufer

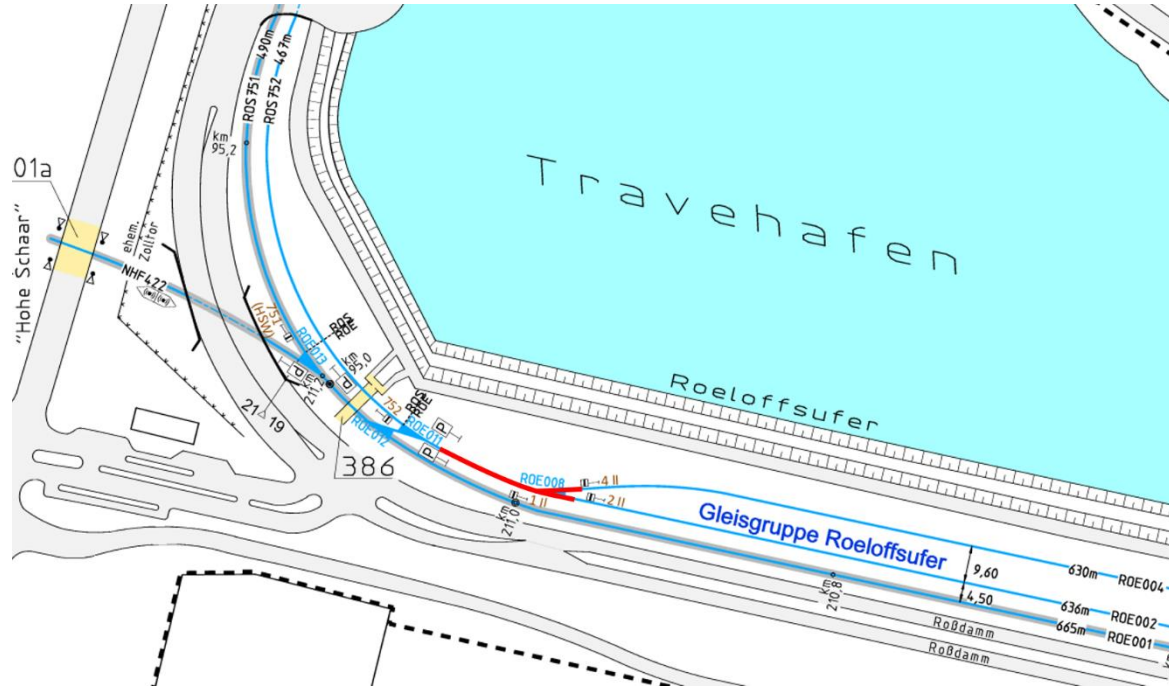


- Gleis ROE 008_011V und Weiche ROE 008W
 - Di, 26.10.21, 07:00 h – Sa, 30.10.21, 18:00 h

Weichenerneuerung Gleisgruppe Ross

- ROS 003W: Mo, 01.11.21, 07:00 Uhr - Mo, 08.11.21, 07:00 h
- ROS 005_012V: Do, 04.11.21, 07:00 Uhr - Mo, 08.11.21, 11:00 h
- ROS 004W, ROS 005W: Fr, 05.11.21, 17:00 Uhr - Mo, 08.11.21, 11:00 h

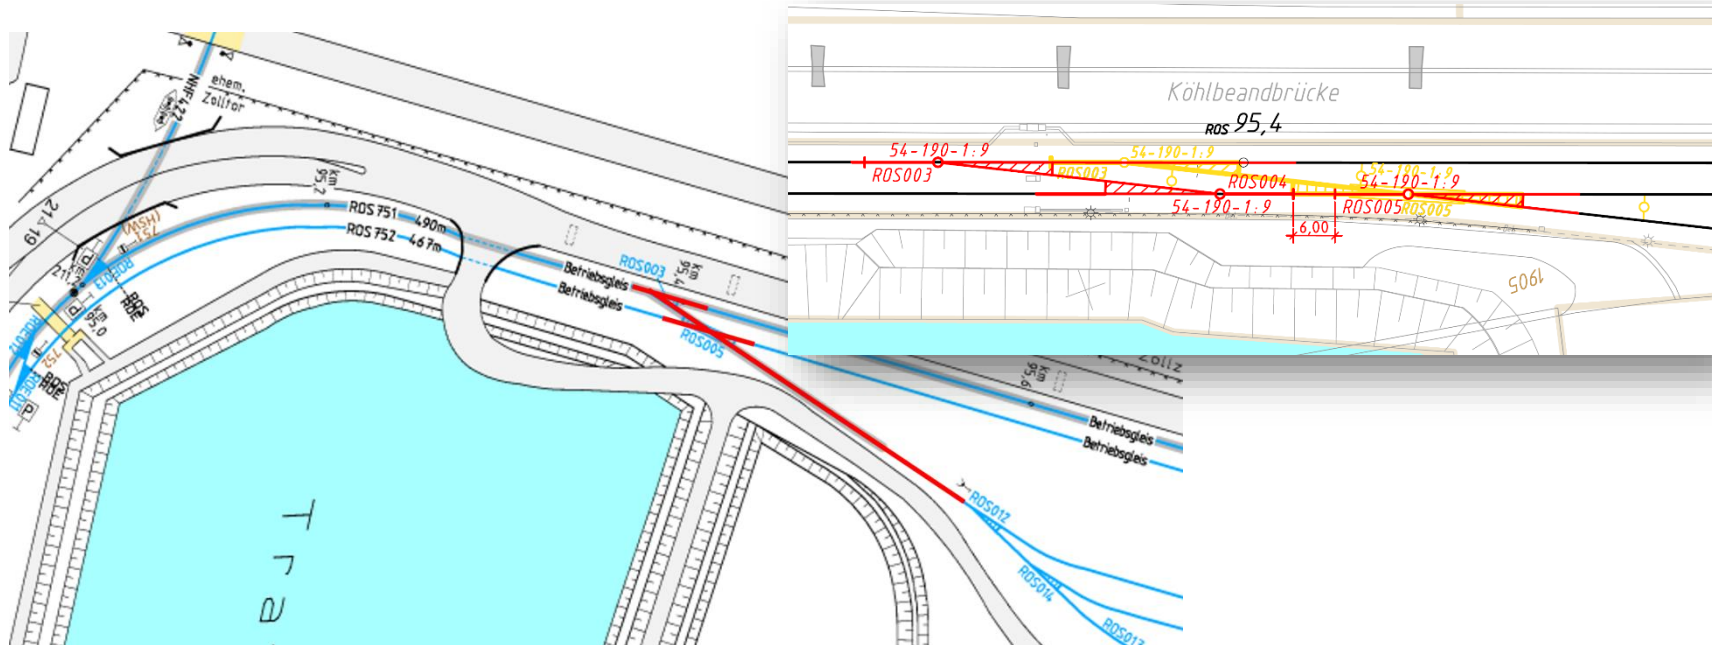


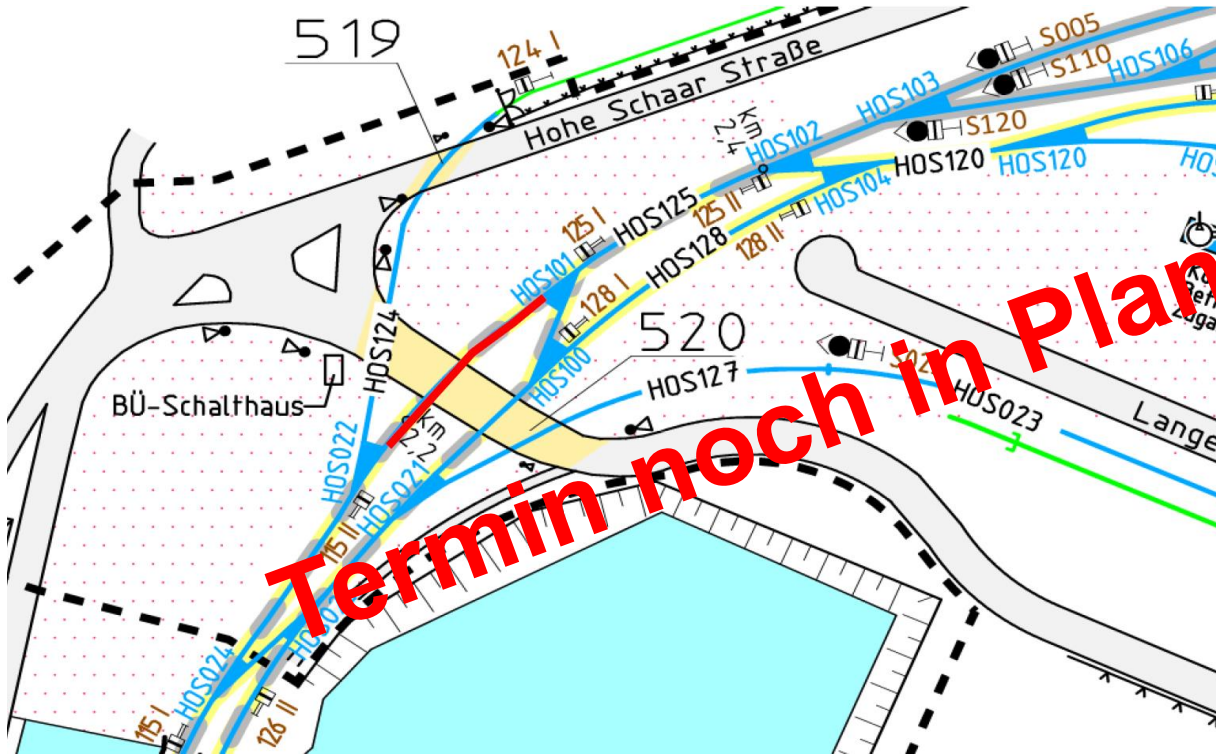

- BÜ 520, HOS 022_101V

Termin noch in Planung

Weichen und Gleise Hohe Schaar

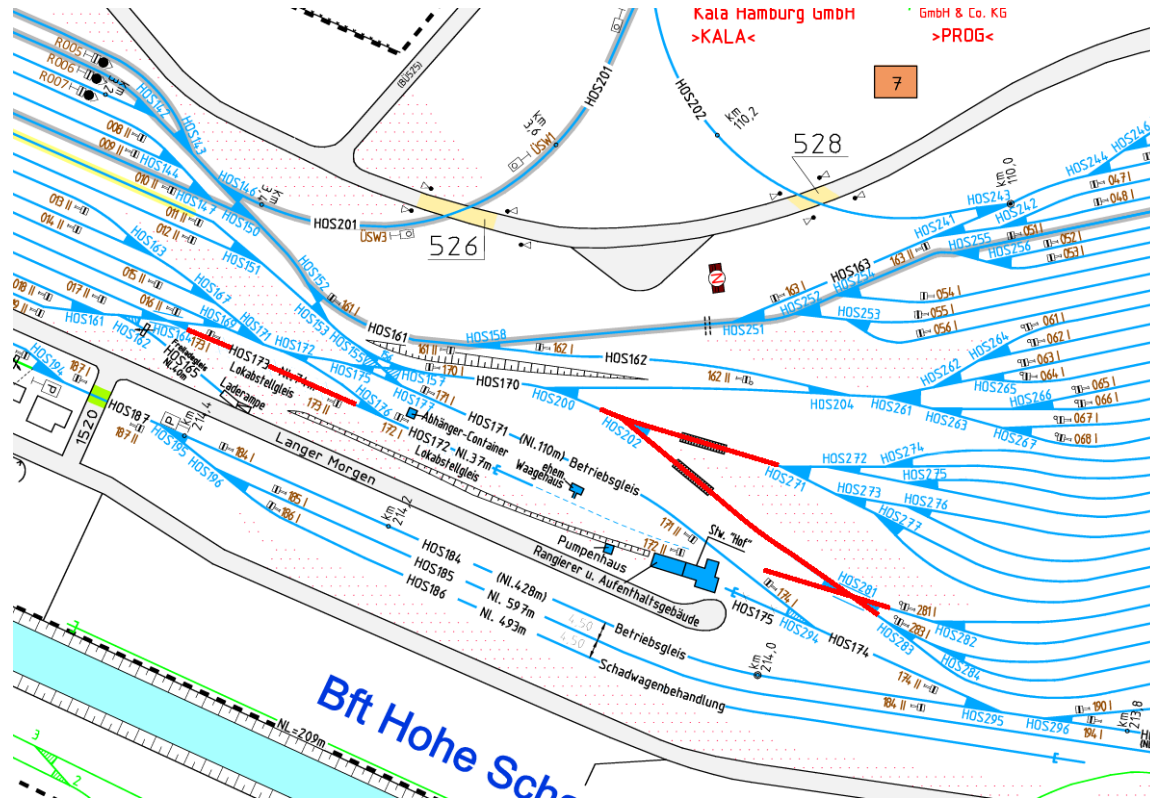


- HOS 173G
 - Zusammen mit BÜ 520
- HOS 281W, HOS 202_281V
 - Mo, 13.09.21, 07:00 -
Mo, 20.09.21, 07:00 h
- HOS 202W, HOS 202_271V
 - Mo, 20.09.21, 07:00 -
Sa, 25.09.21, 16:00 h


Rethedamm, Pollhornweg

- RET 415W (Anschlussweiche EVOS)
 - Mo., 16.08.2021, 6:00 h bis
 - Mi., 18.08.2021, 22:00 h

- POL 812G
 - in Planung

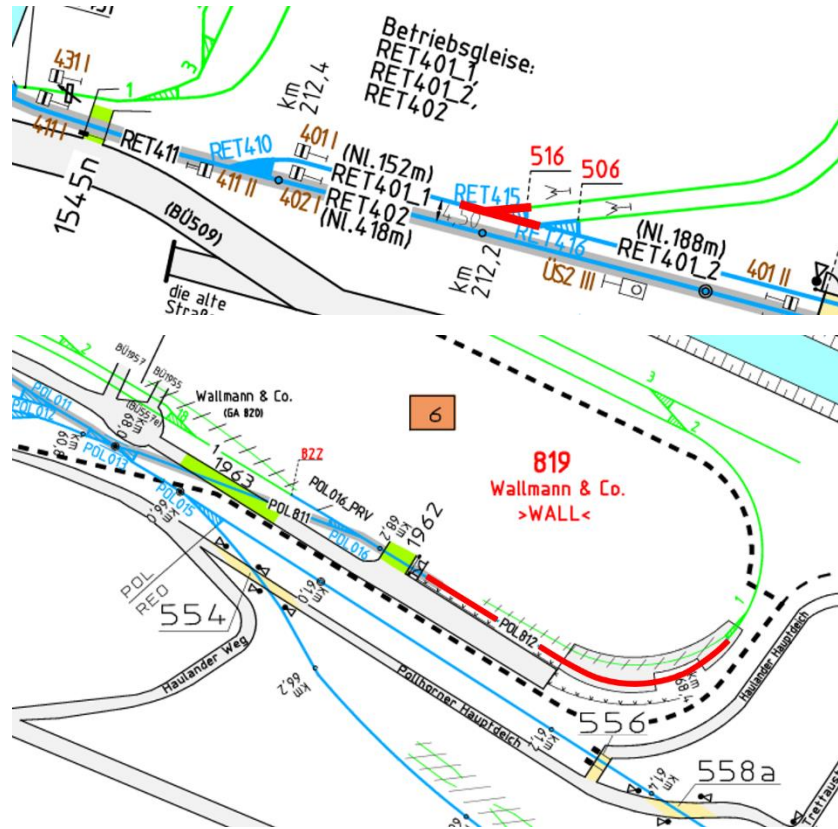


Weichenerneuerung Waltershof

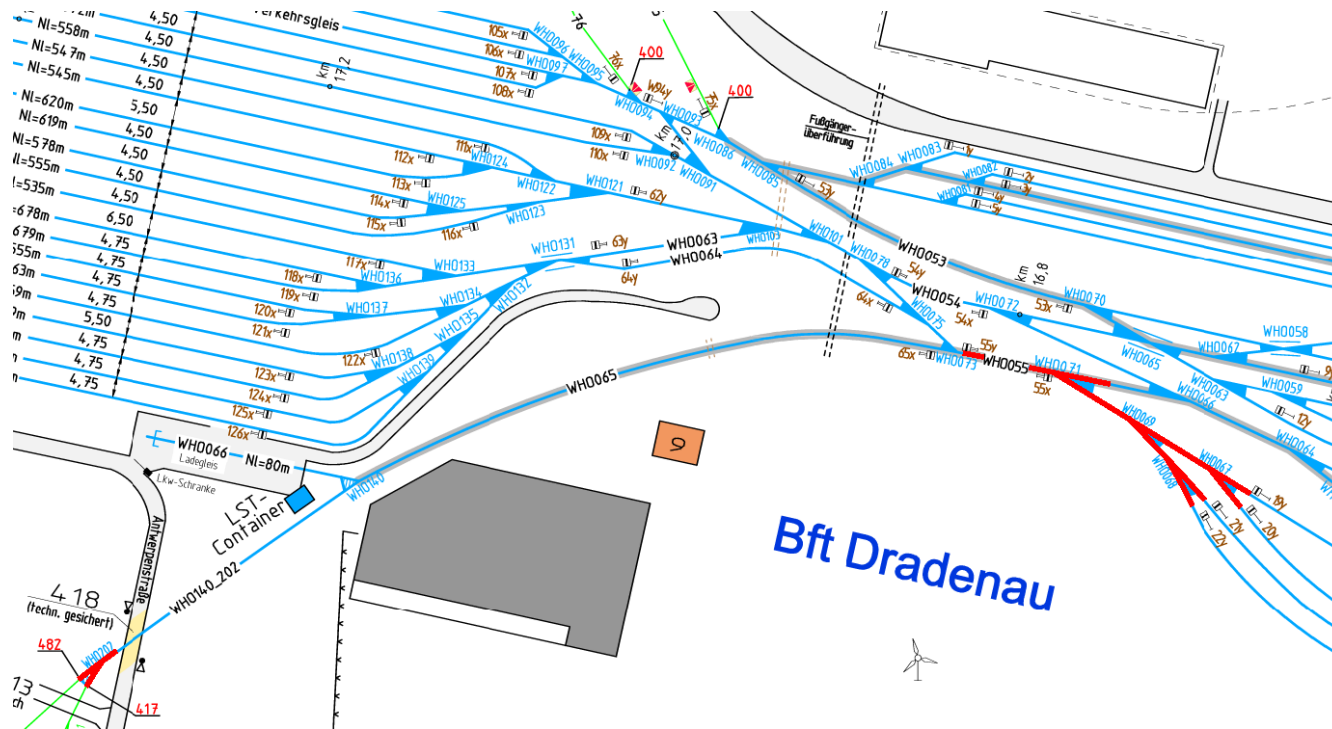

- WHO 067W, WHO 068W,
Di, 19.10.21, 10:00 h -
Fr, 22.10.21, 10:00 h
- WHO069W, WHO071W,
WHO055G
Fr, 22.10.21, 10:00 h -
Mo, 25.10.21, 18:00 h
- WHO 202W
Fr, 22.10.21, 10:00 h -
Di, 26.10.21, 14:00 h


Weichenerneuerung Alte Süderelbe

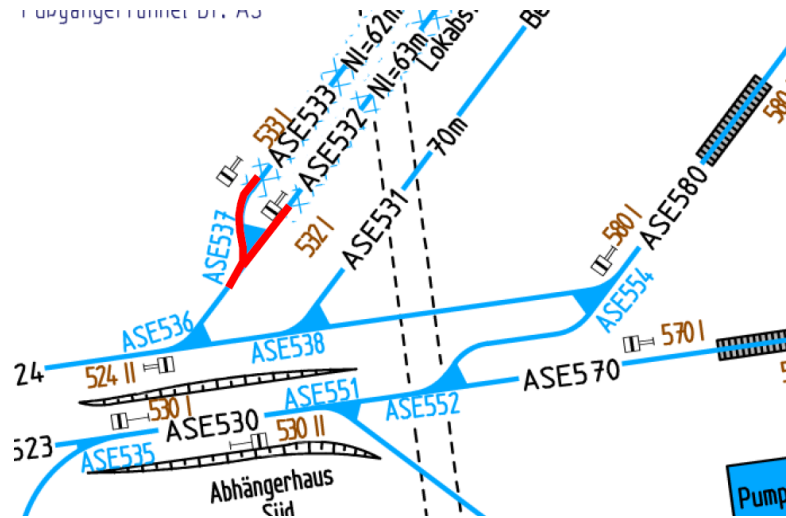


- Weiche ASE 537W (ASE 536W)
 - Fr, 24.09.21, 18:00 h - Mo, 27.09.21, 09:00 h

Weichenerneuerung und Schienenwechsel Pfingsten

- Erneuerung Weiche HBR 814W
 - Sa. 22.05.2020, 12:00 h - Mo. 24.05.2020, 14:00 h

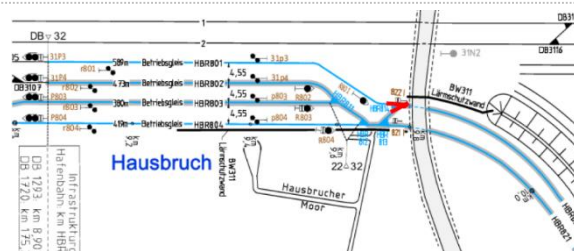


- Schienenwechsel WHO 031G, WHO 032G
 - Schienen abziehen:
 - Sa. 22.05.2021, 07:00 - 12:00 h (WHO 031G)
 - Sa. 22.05.2021, 12:00 - 17:00 h (WHO 032G)
 - Schienenwechsel
 - So. 23.05.2021, 06:00 h bis
 - WHO 031G: Mo. 24.05.2021, 18:00 h
 - WHO 032G: Mo. 24.05.2021, 12:00 h
 - DUA-Stopfarbeiten
 - Sa. 29.05.2021, 07:00 – 12:00 h (WHO 031G)
 - Sa. 29.05.2021, 12:00 – 17:00 h (WHO 032G)

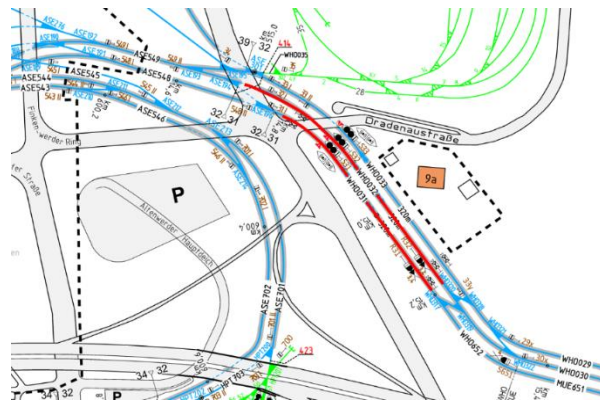


Gleis- und Weichenerneuerung Mühlenwerder (1)

- MUE 630G
 - Fr, 05.11.21, 18:00 h -
Mo, 15.11.21, 06:00 h
- MUE 028W, MUE 029W
 - Fr, 19.11.21, 18:00 h -
Mo, 22.11.21, 09:00 h
- MUE 030W, MUE 031W
 - Fr, 26.11.21, 18:00 h -
Mo, 29.11.21, 09:00 h

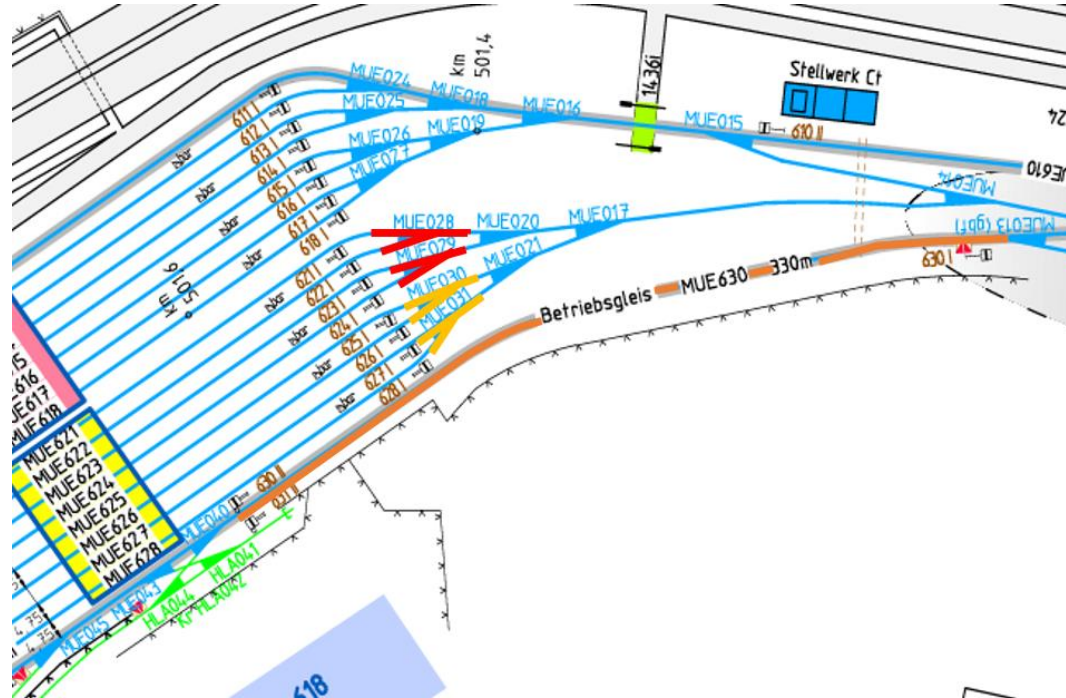

Gleis- und Weichenerneuerung Mühlenwerder (2)


- MUE 067W
 - Mo, 06.12.21, 07:00 h -
Mi, 08.12.21, 17:00 h
- MUE 068W
 - Fr, 10.12.21, 07:00 h -
Mo, 13.12.21, 14:00 h
- MUE 070W, MUE 071W
 - Fr, 10.12.21, 07:00 h -
Mo, 13.12.21, 21:00 h

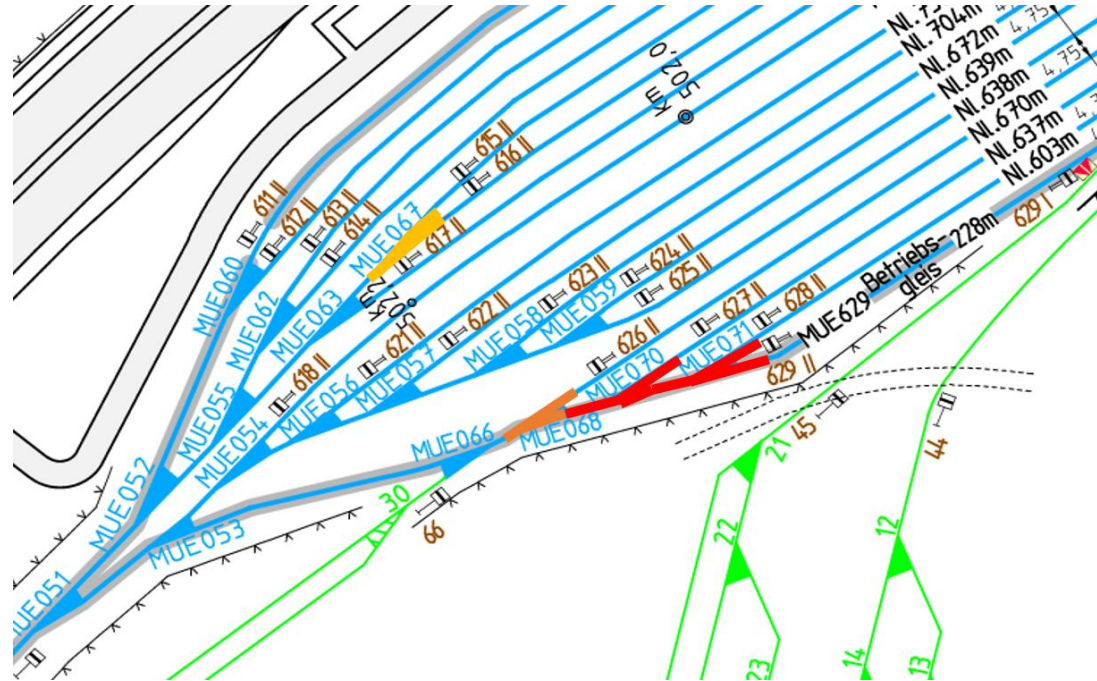


02

Projekt Verkehrsanbindung Burchardkai -
3. Gleis nach Mühlenwerder
Jens Dippel

3. Gleis nach Mühlenwerder – aktueller Projektstand

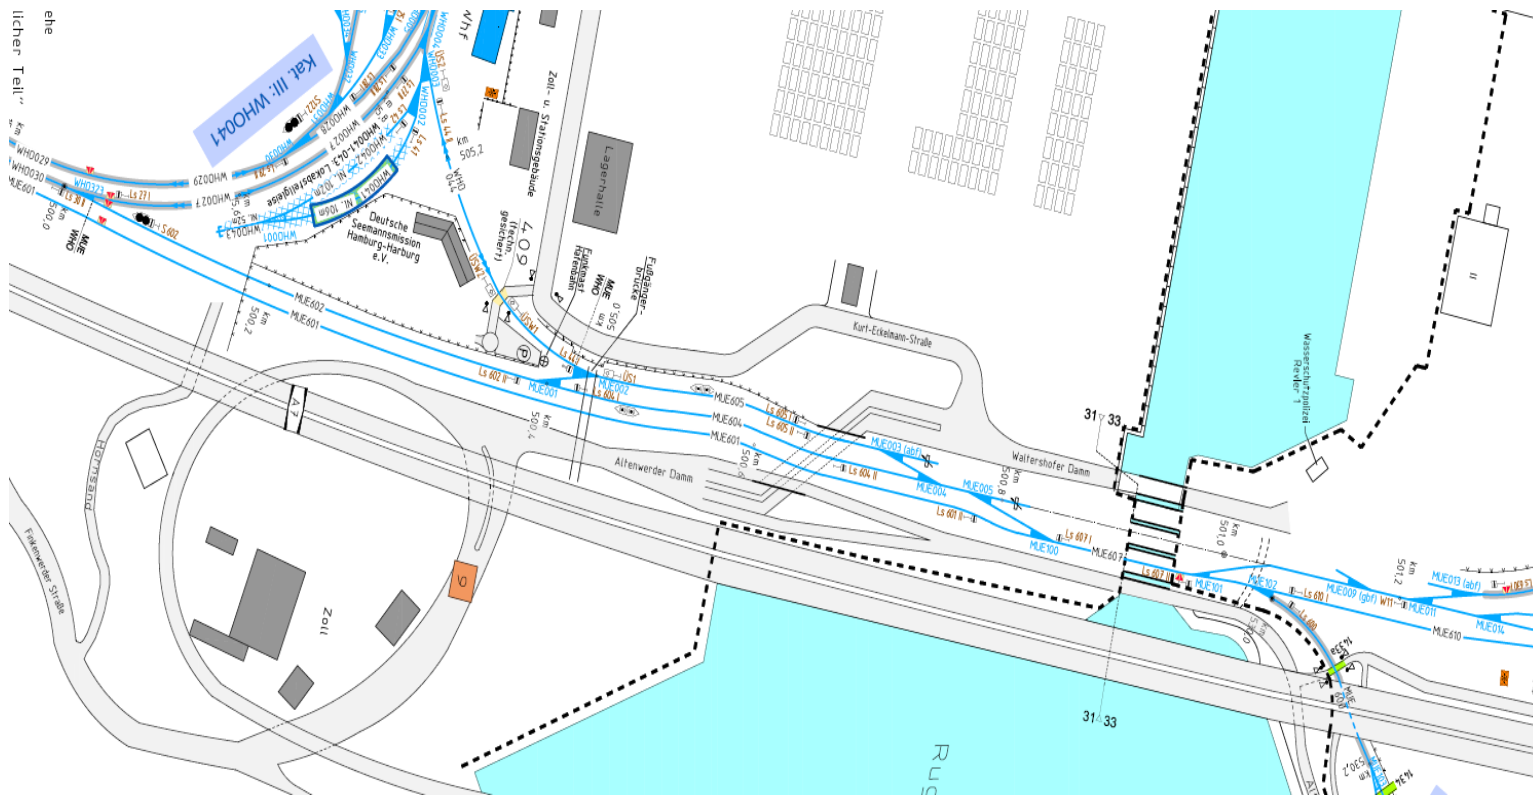

Einbau der Weichen MUE007 und 008 am 16./17.1.2021

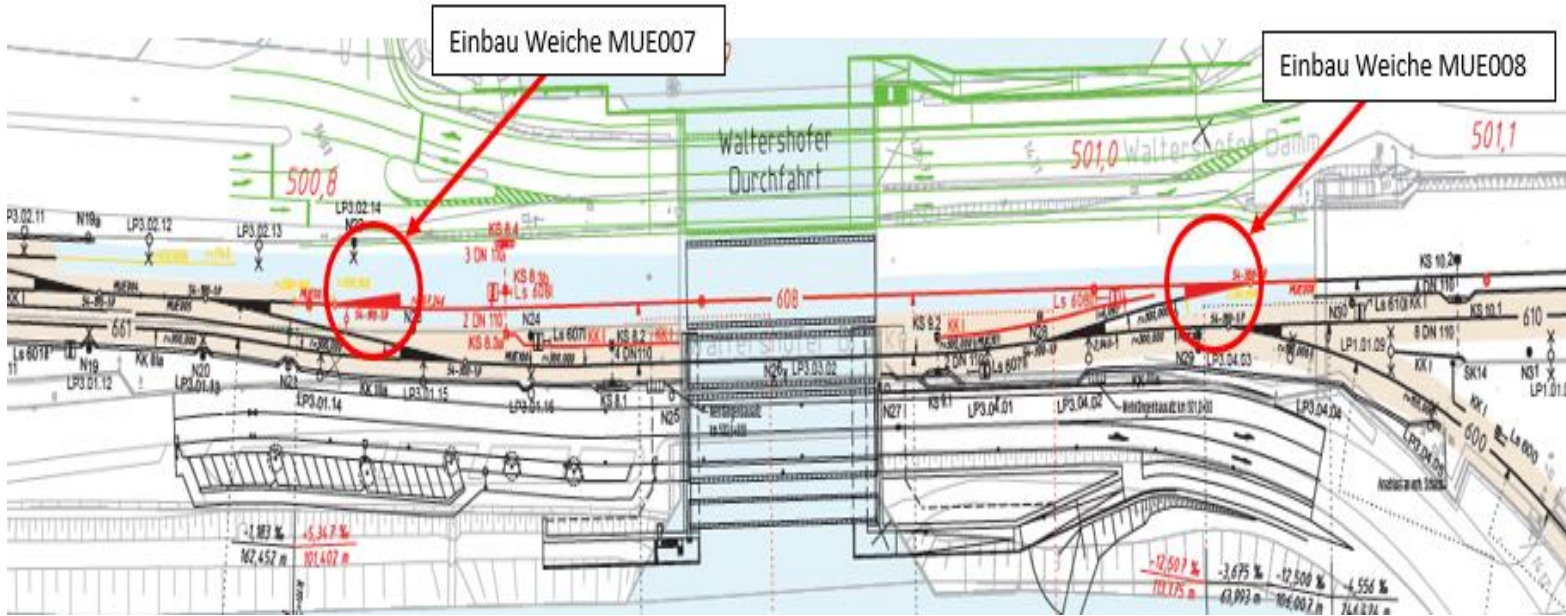

Einbau der Weichen MUE007 und 008 am 16./17.1.2021



Quelle: Bild © HPA

Einbau der Weichen MUE007 und 008 am 16./17.1.2021




Quelle: Bild © HPA

Einbau der Weichen MUE007 und 008 am 16./17.1.2021



Quelle: Bild © HPA

3. Gleis nach Mühlenwerder – Sperrpausen im Februar

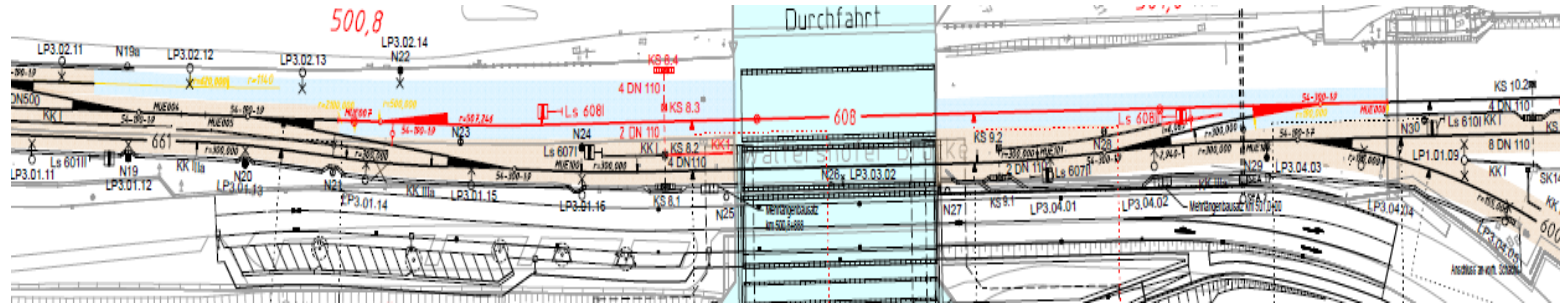


Ziehen Kettenwerk, Einbau Trenner uvm: Sa 06.02., 6:00 h – 13:00 Uhr (7 h)

→ **CTB und Mühlenwerder komplett nicht erreichbar**

Schaltereinbau: So 07.02., 6:00 Uhr – 14:00 h (8 h)

→ **CTB und Mühlenwerder (MUE 621-628) nicht erreichbar**

3. Gleis nach Mühlenwerder – Sperrpausen im Februar

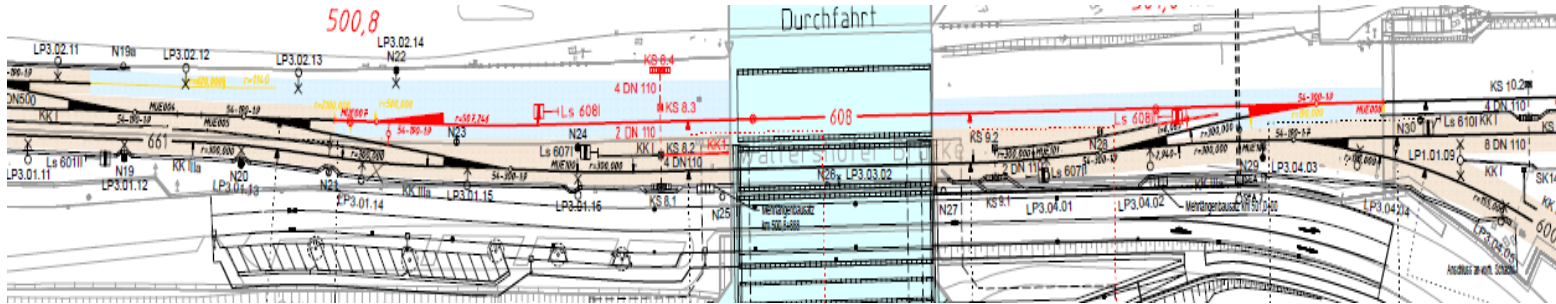

Ziehen Kettenwerk, Abnahme: Sa 13.02., 18:00 h – So 14.02., 6:00 h (12 h)

→ **CTB und Mühlenwerder nicht erreichbar**

Inbetriebnahme Zweigleisigkeit: 14.02.2021, 6:00 h

Schalereinbau: Mo 15.02., 7:00 h – 15:00 Uhr (8 h)


→ **CTB und Mühlenwerder komplett nicht erreichbar**

03

Baustellen der DEGES in Verbindung
mit der Hafенbahn
Hans-Otto Cramer
(Baubevollmächtigter DEGES)

Baustellen der DEGES in Verbindung mit der Hafenbahn

- Übersicht

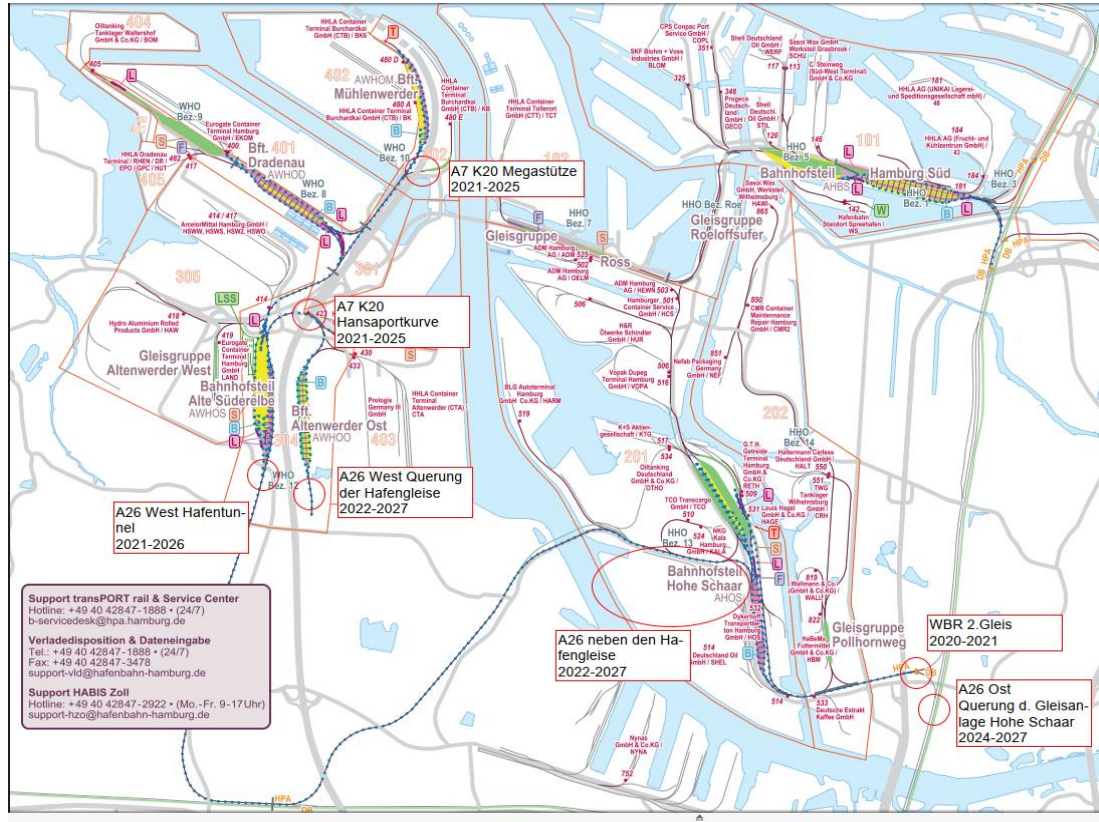

- Schnittstellen A7 (K20)

- Vertraglich vereinbarte Sperrungen:

Eine langfristig vorab abgestimmte Totalsperrung darf insgesamt nicht länger als 8 Stunden am Stück dauern. Ausnahmen von diesen Grundsätzen können nach Absprache mit der Baubetriebsplanung der Hafenbahn durch die Kreuzungsbeteiligten gemeinsam festgelegt werden.

Ausnahmsweise können Totalsperrungen, welche länger als 8 Stunden dauern, an verlängerten Wochenenden bzw. hohen Feiertagen wie Neujahr, Ostern, 1. Mai, Pfingsten und Weihnachten von den Kreuzungsbeteiligten gemeinsam vereinbart werden.

- Achse 97 (Megastütze)

Einbau eines Arbeitsgerüsts, damit die Megastütze saniert werden kann.

- Hansaportkurve (Achse 49/50)

Umbau der Oberleitung und Beleuchtung, damit das Bauwerk nach innen ergänzt werden kann. Damit die Sperrungen klein gehalten werden, wird ein Schutzgerüst über die Gleisanlage gebaut

Baustellen der DEGES in Verbindung mit der Hafenbahn

- Megastützen Achse 97



Quelle: Bild © DEGES

Baustellen der DEGES in Verbindung mit der Hafenbahn

- Hansaportkurve




Quelle: Bild © DEGES

- Schnittstellen A26 (Hafentunnel)
 - Umbau und Erweiterung der Gleisanlage
 - 2021 geplant:
 - Fortführung der Umverlegung aller Kabel zur Sicherstellung des Betriebs während des Bau, zur Zeit finden Arbeiten zur Herstellung der neuen Kabelwege statt und ab Ende Januar wurde begonnen mit der erforderlichen Kabelverlegung. Umschaltung der LST-Kabel ist aktuell für den Juni 2021 geplant.
 - Einbau von einem Weichenkreuz Ostern und Pfingsten
 - Herstellung der erforderlichen Bahndammerweiterung ab ca. 2. Quartal 2021
 - 2022 aktuell aufgrund der Arbeiten am Hafentunnel keine längeren Sperrungen geplant

Baustellen der DEGES in Verbindung mit der Hafentunnel

- Lageplan Kreuzung Hafentunnel

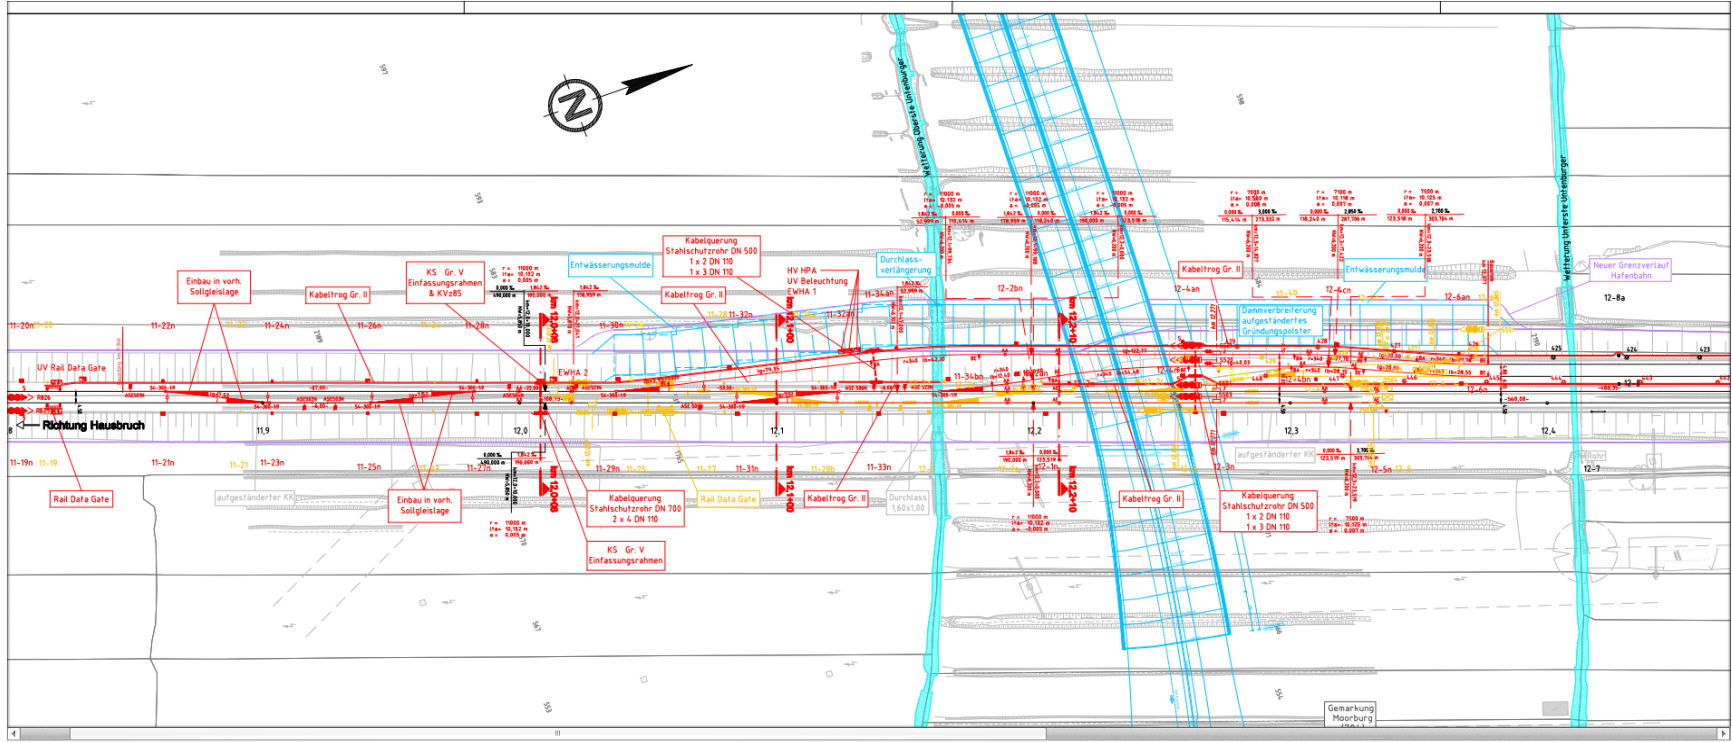

- 2. Gleis der Strecke 1254
 - Am 15.01.2021 wurde mit der Inbetriebnahme des Bauzustandes 5 der formale Abschluss der Arbeiten an der WBR erreicht.
 - In 2021 sind noch Rest- und Rückbauarbeiten geplant.

Baustellen der DEGES in Verbindung mit der Hafenbahn

- 2.Gleis 1254 – Ausbau der Brücke alte WBR



Quelle: Bild © DEGES

Baustellen der DEGES in Verbindung mit der Hafenbahn

- 2.Gleis 1254



Quelle: Bild © DEGES

04

Fragen und Antworten


Wie kann ich mich informieren?

1. Infoveranstaltungen

- **Nächster Termin:**


Donnerstag, 22.04.2021
15:00 Uhr

2. Newsletter

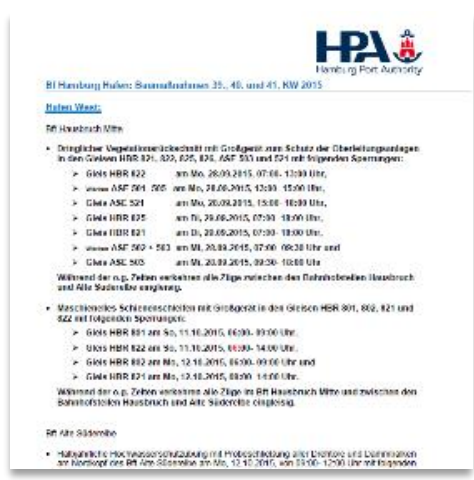

Anmeldung:
service-gleisanschluesse@hpa.hamburg.de

3. Internet



<https://www.hamburg-port-authority.de/de/auf-der-schiene>

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



© HPA-Bildarchiv, Andreas Schmidt-Wiethoff

Hamburg Port Authority AöR

Neuer Wandrahm 4

20457 Hamburg

Tel.: +49 40 42847-0
