HPA Hamburg Port Authority
Neue Bahnbrücke Kattwyk

Terminplan Bauvergaben und Ausführung

- April 2016 -

Nr.	Vorgangsname	Dauer
1	**Vergabeeinheit VE 001 - Landseitige Erschließung West**	**800 Tage**
2	Vergabeverfahren	7 Monate
3	Bauausführung	33 Monate
4		
5	**Vergabeeinheit VE 002 - Landseitige Erschließung Ost**	**980 Tage**
6	Vergabeverfahren	6 Monate
7	Technische Bearbeitung	9 Monate
8	Bauausführung	40 Monate
9		
10	**Vergabeeinheit VE 03 a - Unterbauten und Dükerleitung**	**890 Tage**
11	Teilnahmewettbewerb	22 Wochen
12	Vergabeverfahren	8 Monate
13	Technische Bearbeitung	29 Wochen
14	Bauausführung Strompfeiler	19 Monate
15	Bauausführung Widerlager	14 Monate
16		
17	**Vergabeeinheit VE 03 b - Überbauten und Technische Ausrüstung**	**1443 Tage**
18	Teilnahmewettbewerb	4 Monate
19	Vergabeverfahren	9 Monate
20	Technische Bearbeitung	9 Monate
21	Materialbestellung	7 Monate
22	Vorlauf Fertigung Stahlbau	9 Monate
23	Montage Überbauten	10 Monate
24	Bauausführung Maschinenbau - EMSR - Bahntechnik	6 Monate
25	Anbindung Betriebsgebäude	5 Monate
26	Inbetriebsetzung und Probebetrieb Brücke	11 Monate
27	Funktionsprüfung unter Betriebsbedingungen	9 Monate
28		
29	**Vergabeeinheit VE 03 c - Betriebsgebäude**	**720 Tage**
30	Vergabeverfahren	6 Monate
31	Technische Bearbeitung	6 Monate
32	Bauausführung Betriebsgebäude 1	20 Monate
33	Bauausführung Betriebsgebäude 2	14 Monate
34		
35	**Vergabeeinheit VE 004 - Richtfeuer Moorburger Weide**	**200 Tage**

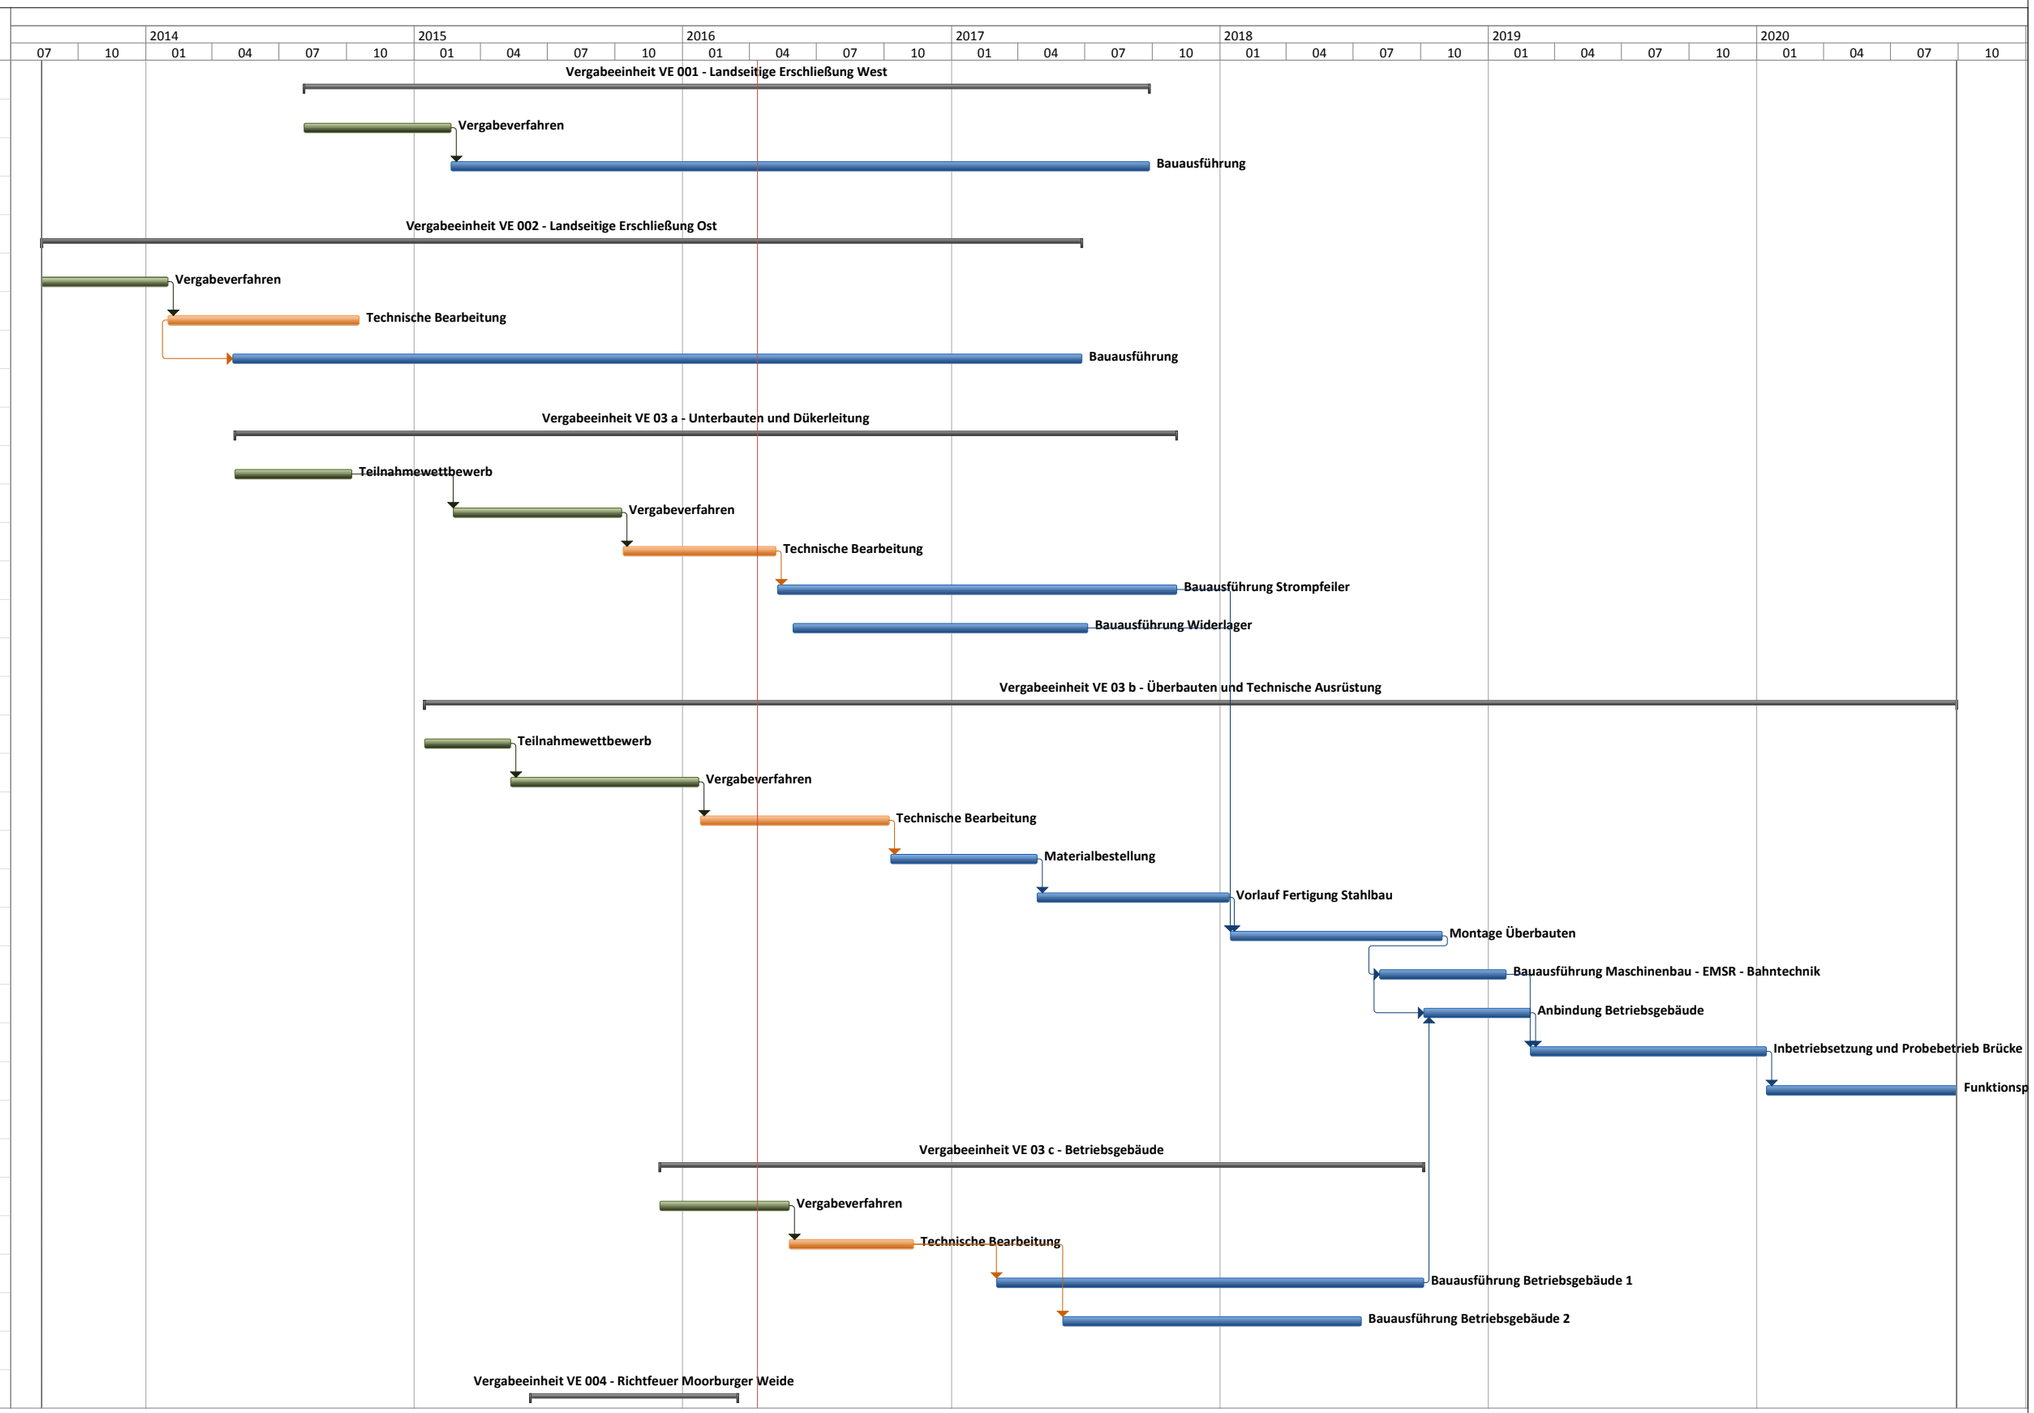

Leistung HPA
Leistung Dritter
Leistung ARGE: Techn. Bearbeitung
Leistung ARGE: Bauausführung
Meilenstein
Sammelvorgang
Schnittstelle zu anderer VE

Stand: 13.04.2016

HPA Hamburg Port Authority
Neue Bahnbrücke Kattwyk

Terminplan Bauvergaben und Ausführung

- April 2016 -

Nr.	Vorgangsname	Dauer
36	Vergabeverfahren Stahlbau und Technische Ausrüstung	3 Monate
37	Technische Bearbeitung	3 Monate
38	Bauausführung	4 Monate
39		
40	**Vergabeeinheit VE 005 - Gleisbau**	**780 Tage**
41	Vergabeverfahren	6 Monate
42	Technische Bearbeitung	3 Monate
43	Bauausführung	30 Monate
44		
45	**Vergabeeinheit VE 006 - Oberleitungsanlage**	**790 Tage**
46	Vergabeverfahren	6 Monate
47	Technische Bearbeitung	8 Monate
48	Bauausführung	20 Monate
49		
50	**Vergabeeinheit VE 007 - Leit- und Sicherungstechnik**	**800 Tage**
51	Vergabeverfahren	6 Monate
52	Technische Bearbeitung PT2	6 Monate
53	Zustimmung im Einzelfall der LEA	8 Monate
54	Bauausführung	20 Monate

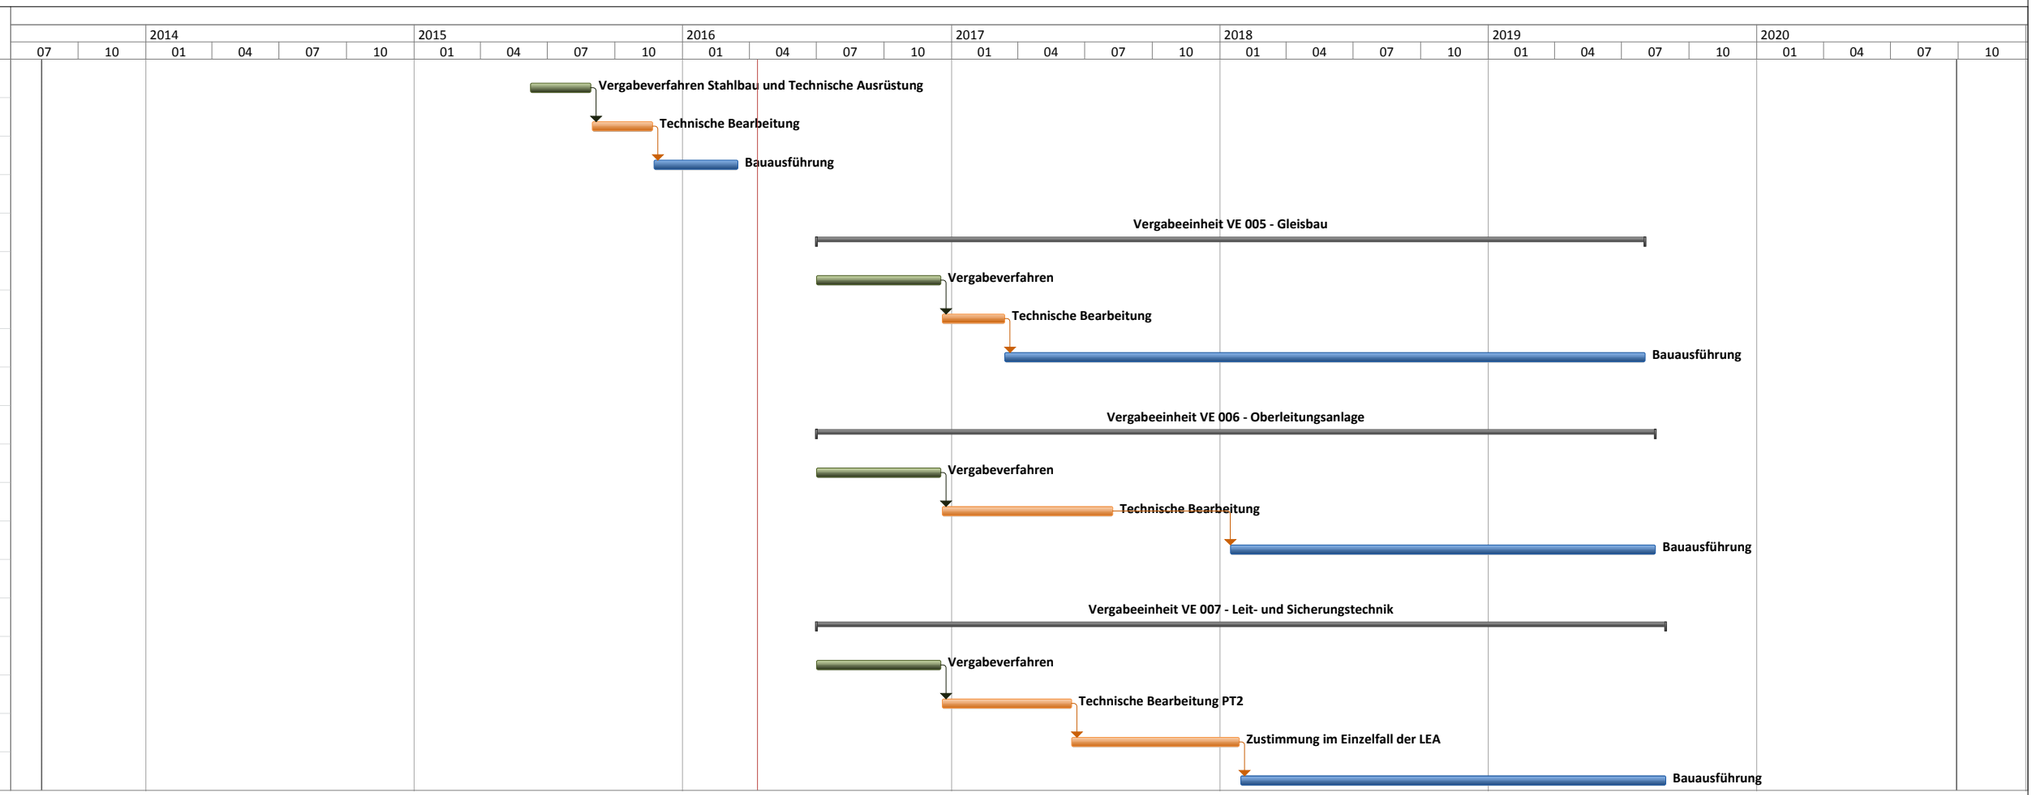

Leistung HPA	Leistung ARGE: Techn. Bearbeitung	Meilenstein	Schnittstelle zu anderer VE
Leistung Dritter	Leistung ARGE: Bauausführung	Sammelvorgang	

Stand: 13.04.2016
